



Udviklingsplan for Næstved Golfbane pr. 1. juni 2023

Planen er udarbejdet af Golfbanen A/S i samarbejde med Næstved Golfklub for stedse at føre golfbanen "up to date" og derved gøre den til en spændende oplevelse både golf- som naturmæssigt for såvel klubbens medlemmer som tilkomne greenfee-spillere.

De efterfølgende tiltag har til formål at ændre banens karakter fra en parkbane til en mere naturbane gennem varieret klippeforhold og individuelle udformninger af de enkelte huller samt ved nedlæggelse af flere fairwaybunkere, hvor effekten af disse i forhold til tilsvarende rough eller græsunker ikke vil have nævneværdig indflydelse på spillet. Og på denne måde nedbringer tiden til vedligeholdelse af store dele af banen for derimod at sikre optimal udnyttelse af arbejdskraften på de naturlige spillearealer.

Planen vil ændre længden af enkelte huller (og dermed "baner") for at imødekomme ønsket om et enkelt kort par-3 hul og for at justere længden på enkelte par-4 huller især for Tee 49, hvor nogle huller for klubspilleren har urimelige længder.

Da Tee 43 tilsyneladende ikke anvendes efter hensigten overvejes det helt at nedlægge denne - ikke mindst pga. en omlægning/nivellering af tee-stederne med tilhørende vanding ikke skønnes at være for omkostningsfuld.

Planen vil være udgangspunkt for den rullende 5-årige handlingsplan, som udarbejdes i samråd med Næstved Golfklub under skyldig hensyntagen til Golfbanen ApS økonomi og den tilstedeværende arbejdskraft.

Tee-steder

Disse skal forsat formgives runde og med mulighed for vanding for at fremstå bløde og ukrudtsfrie. Der klippes en bane semirough omkring tee-stederne, som sammenklippes i størst mulig udstrækning for at fremstå mere markant og på denne måde samtidig forenkle det klippede stisystem. Klippes to gange om ugen (afhænges af vækst).

Tee-stederne på hul 4 og 7. Tee 49 flyttes til Tee 43, som gøres større med mulighed for vanding (dette er for at tilgodese spillere som ikke er langt slående).

Tee-stedet på hul 7 for de to længste baner sammenlægges.

På hul 16 bibeholdes det forreste tee-sted og der etableres et nyt, som gør hullet ca. 80-100 m langt (dette drøftes med DGU's banearkitekt). Hvid tee skal ikke gøres kortere.

Fairways

Disse udformes smalle, individuelt for det enkelte hul på en måde som drager bunkers mest muligt i spil og samtidig skaber passende landingsområder for drives og "lay-up" områder. Bør starte på en afstand fra forreste teested, som gør det muligt for enhver golfspiller at nå denne ved valg af det teested, som passer til den enkelte spillers formåen/handicap.

Kanterne ind mod den ene bane semirough, som går såvel inden som uden om fairway bunkers og dermed omkranser fairway, bør udformes i bløde linjer.



Bunkers

Da bunkers kræver megen pleje i det daglige med vedligeholdelse af kanter, lugning af ukrudt, rivning af sand gerne to gange ugentligt, omlægges nogle til græs-bunkers eller rough og andre til "Run-off" områder. Sidstnævnte i forhold til enkelte greens med højdeforskel til det omkringliggende terræn, for på denne måde at inkorporere et nyt element i spillet. Om green-bunkers klippes på indersiden individuelt forgreen/semirough og på ydersiden med en bane semirough.

Der tilføres efter behov fornøden grus af den nuværende type, så sandet fremover vil have så ensartet konsistens som muligt. Riser udskiftes til den nye type med sort hoved og i en mængde, så der er tilstrækkeligt i hver bunker.

Årsagen til vores bunkers er hårde, er at de ikke er drænet. Når det regner, kan vandet ikke komme væk. Det bevirker at ler bliver skyllet op i sandpartiklerne og når det tørre op, brænder leret af og det giver hårdt sand.

Greens og forgreens

Plejen af disse intensiveres og vedligeholdes så svamp får sværere vilkår. Greens klippes 6-7 gange om ugen og tromles efter behov for at fremstå så jævne og ens som muligt.

Greens omkranses på siderne og bagpå af en bane forgreen som in spilleretningen fortsætter 15-25 m ud mod fairway.

Visse greens kan klippes mere i violinkasse facon så forgreen kan forhindre et lige put mod hullet og dermed give sværere pindplaceringer.

Rough

Vil for største partens vedkommende blive klippet for at banen skal have færrest mulige områder, der virker urimeligt sinkende for spillet, for derved at fremme hurtigt spil på banen og dermed øge kapaciteten. Klippes afhængig af vækstforhold hver eller hver anden uge.

Uklippet rough vil forefindes af hensyn til plante- og dyrelivet, hvor arealerne normalt ikke kommer i spil og derved spare arbejdskraft og drivmidler samt slid på maskinerne. Uklippet rough vil forekomme bag og langs teestederne helt frem til fairways begyndelse og ca 15 m til siderne for fairway, også hvor der måtte være bevoksning. Den uklippede rough tyndes op til et par gange i sæsonen.

Banen ønsker at være bi-venlig golfbane og der vil fremover fortsat blive plante vilde blomster på udvalgte steder.

Beplantninger

Beplantningen skal "fange" vildfarne bolde give tab af afstand, men stammes op så der gives mulighed for rimeligt sving. Rosenkrat og andre tornede buske ønskes fjernet.



De fleste rødtjørn, som er meget vindfølsomme, vil blive udskiftet med anden type træer f.eks. naver og eg.

Poppeltræer, som primært blev plantet som ammetræer og derfor i dag hæmmer de ønskede træer i at udfolde sig, som har mange rødder liggende oven på jorden og som meget tidligt på sæsonen smider mange store blade, ønskes fjernet.

Syrenkrat nedskæres, så de kan skyde nedefra igen, og nogle fjernes helt, hvor de er ulovligt plantet.

Nedlagte rosenkrat og andre egnede steder vil blive tilsået med vilde blomster.

Vandområder

Disse har stor naturmæssig værdi og bør fremstå med klare vandspejl og kun en let randbevoksning.

Der er behov for en opgravning af flere søer og vandløb. Siv, rør og dunhammer skal nedbringes mest muligt, men iris- og myntheplanter ønskes bevaret.

For at tilsikre vand i det store forbundne vandkompleks på de sidste fem huller, ønskes etableret et opstemningsværk/overløb neden for tilløbet fra hullerne 15-17. Bredderne ved hul 14 og 18 "løftes" gennem en fundering af terrænet.

Vandingsanlægget

Er efterhånden nogle steder ret nedslidt. Det har ikke været muligt at lukke for vandet til de enkelte greens eller teesteder, et forhold som er påbegyndt ændret i 2022 på forni og som forventes at fortsætte de næste to - tre år.

Der er på flere huller konstateret forkerte sprinklere såvel på teesteder som ved greens med mangelfuld vandings kapacitet.

Dette forventes udbedret i løbet af de kommende år.

Der etableres et syreanlæg til sikring af den rette PH-værdi.

Træningsområdet

Ønskes fortsat udbygget og forbedret. Klipningen omkring indspilsgreen skal give mulighed for at træne i slag, som der er behov at slå mod green.

Der ønskes etableret et græsområde med vanding for træning af approachslag primært for elitespillere.

Ligesom der ønskes etableret et udslagssted for samme kategori, som skal bruges ved træning med driver.

Par-3 banen

Denne tilstræbes holdt efter samme strategi/princip som 18 hullers banen.



Greens gøres gennem klipning større, og en enkelt GRB ændres til RO. Buskadset omkring banen opstammes kraftigt så der bliver bedre mulighed for at finde og spille bolde, der har været ude af kurs.

Buske og træer beskæres og skoles, så det passer til det udtryk banen skal have. Det sker løbende når der er tid i staben. Alt tjørn fjernes fra banen. Dette arbejde vil altid ske i samarbejde og efter aftale med Baneudvalget.

Hul for hul

På hul 1: Omlægges fairwaybunkere (FB) til alm. rough - slut 2023 - og venstre greenbunker (VGRB) til run-off (RO), som klippes ned i samme højde som forgreenen slut 2023.

På hul 2: Amme-træer i til højre for bunker mod hul 7 skal fjernes, så blivende træer styrkes i vækst - slut 2023





På hul 3: omlægges forreste FB og den midterste GRB i venstre side til GB - slut 2023.

På hul 4: omlægges forreste FB til rough - slut 2023





På hul 5: Nedlægges den runde FB i højre side.

På hul 6: Omdannes VGRB til RO - slut 2024.





På hul 7: Omlægges første FB til rough.

På hul 8: Klippes buske i højre ned og skoles, så det passer til banen.





På hul 9: Omlægges forreste højre FB til rough - slut 2023. Højre greenbunker laves til run-off - slut 2024.


På hul 10: Arbejdes der med banen om at lave en dræn-sø i højre side. Teesteder skal derefter hæves. Tidsubestemt.





På hul 12: Venstre GB skal drænes. 23/24



På hul 13: Omlægges VGRB til RO. Efterår 2024

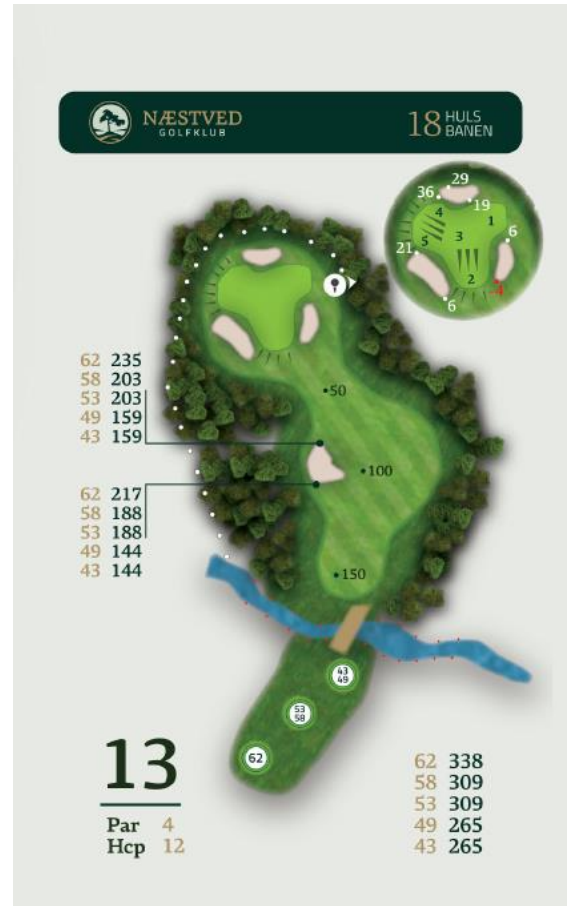



På hul 15: Amme-træer i højre side kort af åen fjernes ca 30 meter mod teested. 2023-2024

På hul 16: Tee 49-53 og måske 58- gøres kortere, men holdes i samme side. Det planlægges med DGU så rating passer.

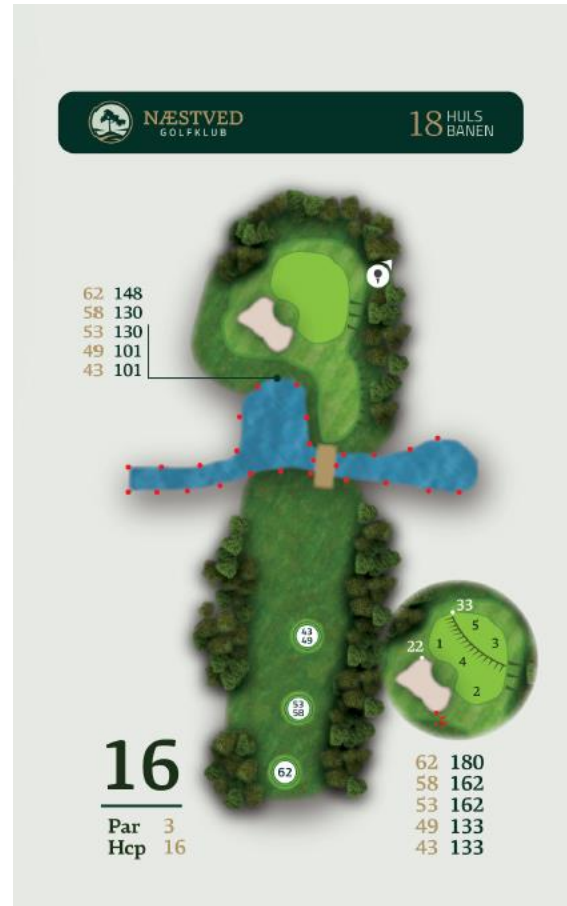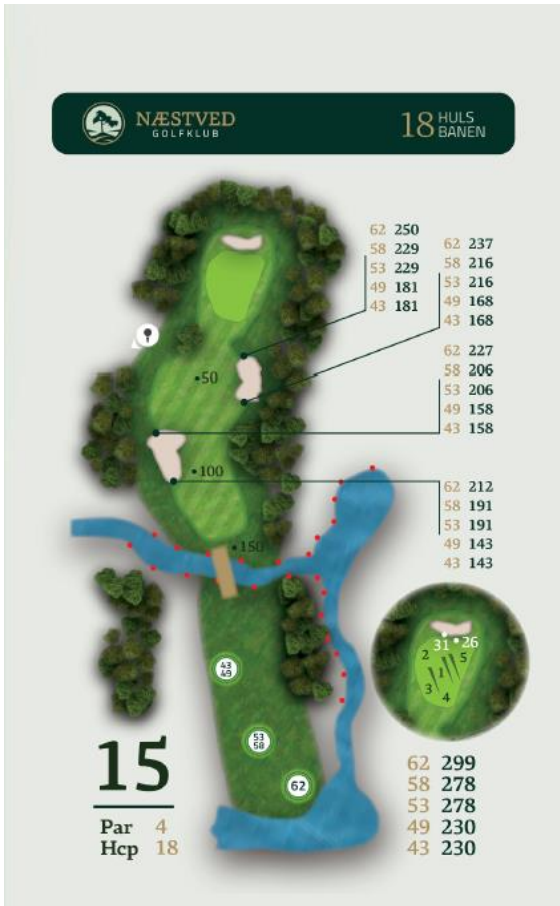



På hul 17: Omlægges begge FB i venstre og den til højre til rough. Efterår 2024. Etablering af ny tee 43-49 kort af søen eller til venstre for træerne i venstre side af søen. Kan muligvis påbegyndes i 2023 når bagni lukkes for vinteren.

